



SAMSONITE BRASIL ROLL OUT SAP

KICK OFF MEETING



AGENDA

PROJETO ROLLOUT INTRODUÇÃO - FC

ESCOPO: MÓDULOS, PROCESSOS E SISTEMAS- CC

FASES DO PROJETO - IN

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES - CG

EQUIPES – IN CC CG

PLANO DE COMUNICAÇÃO - CG

PROXIMOS PASSOS - IN



PROJETO ROLLOUT INTRODUÇÃO



ALCANCE

- **El Proyecto** busca reemplazar el Sistema JDEdwards en Latinoamérica con el ERP SAP AFS, Sistema que se ocupa en Samsonite a nivel global.
- El sistema **SAP** a implementar está basado en el modelo de **Samsonite Latam**, implementado en MX,CO,PA,PE,CL,AR,UY y va a incorporar los requerimientos legales y gaps de operación que aplican a Brasil
- Integración con 3PL(Tecadi), POS, Ecommerce, Nimian(B2B) Mastersaf, Bancos,Auditto , Payroll

Principales Beneficios del Proyecto

Sinergias de procesos para latam

Ejemplos: Master Data comun, Proceso de auditoria, Servicios compartidos y nuevas funcionalidades regionales.

Lo anterior nos permite economias de escala y ser mas eficientes

Sistema WorldClass con best practices

Disaster recovery plan aligned with Global samsonite

Global updates

Mejoras en los costos de OPEX, debido a acuerdos globales

Cloud-based Solution (AWS)

Buen ecosistema de partners en Brazil


Facilidad de integracion (ecommerce/Marketplaces)

Factores Críticos de Éxito

- **NO** es un proyecto de Sistemas (Business First, Technology second..)
- **Compromiso** de equipo local con el proyecto
- **Planificación** adecuada y control
- **Equipo** de trabajo de excelencia
- **Simplificación.**
- **Adaptación** máxima posible a modelo SAP global
- **Integración**

Implementation risks

Principales Riesgos	Mitigacion
Integraciones (POS,Nimian,Tecado,Etc)	• Fuerte coordinacion con partners • Tests potentes con SW de partners
Complejidad de Localizacion Brazil (Taxes and Reporting)	• Implementation con partner con amplia experiencia en Brasil (Escotta) • Se mantendra TAX & Legal reporting Software (Mastersaf), el cual tiene integracion estandar con SAP
Posible impacto en operacion de Samsonite Global	• Realizacion de test de regresion • Configuracion critica sera revisada con Global Samsonite team antes de liberarse en produccion • Todas los libros ficales seran manejadas en Mastersaf

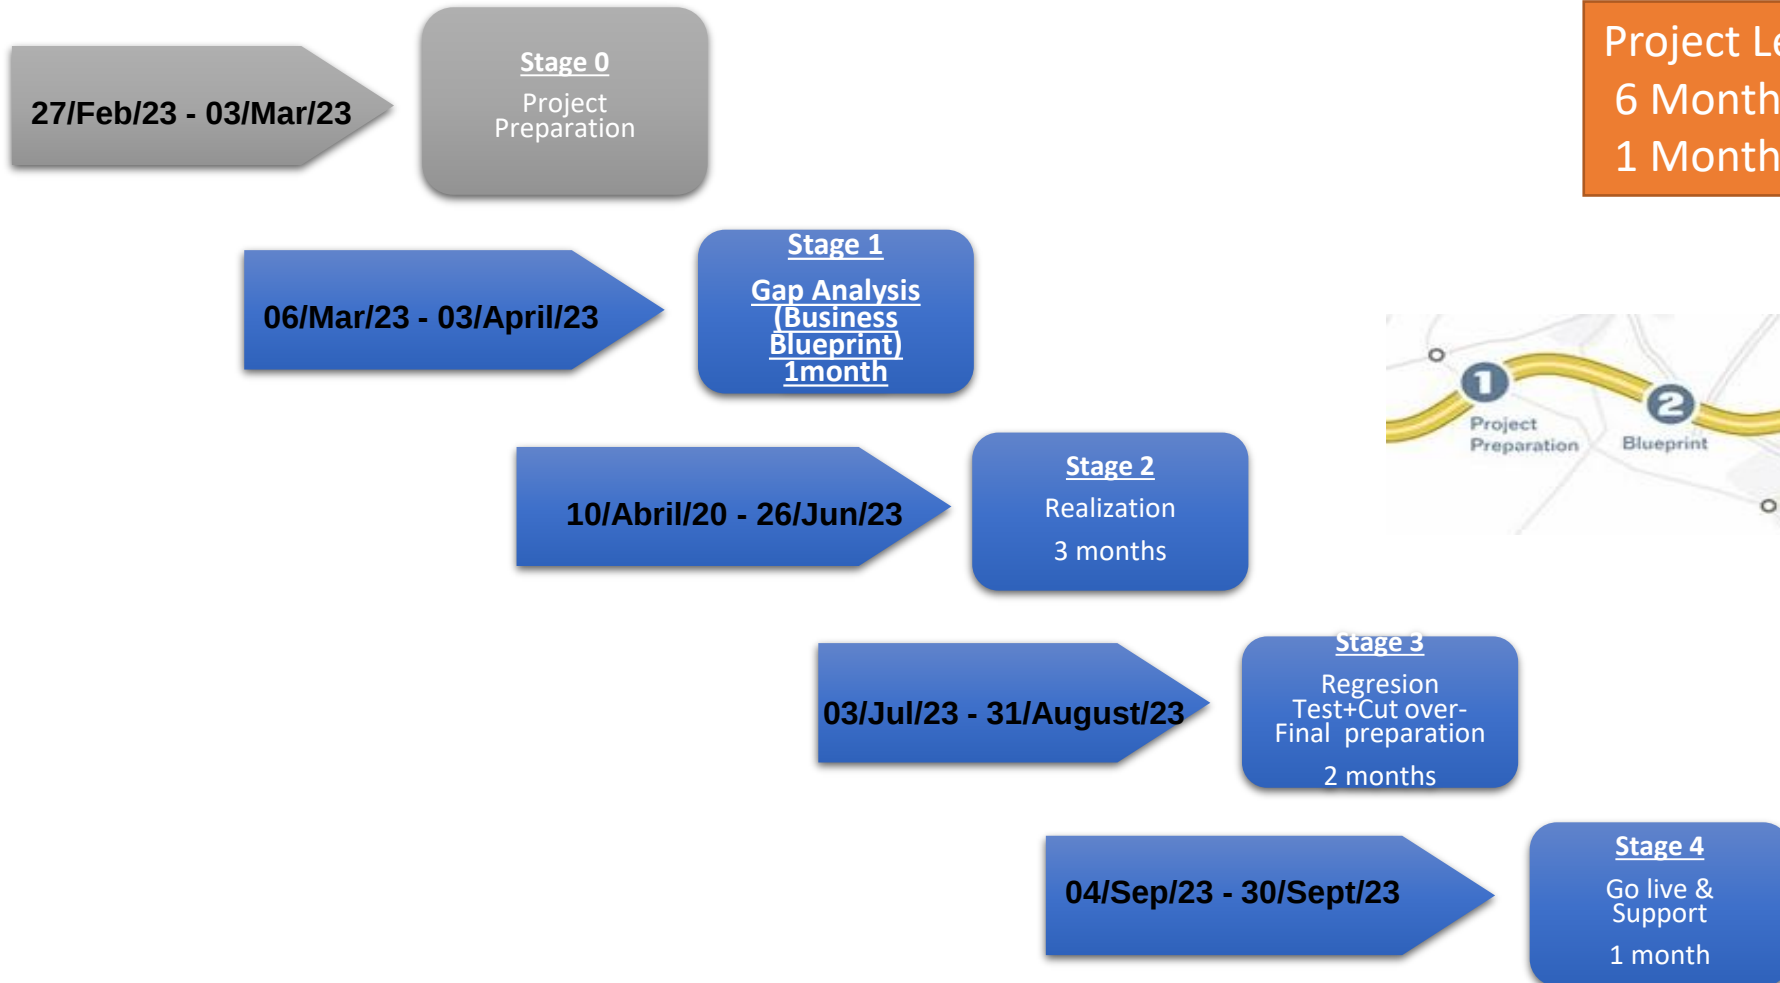

Project Length:
6 Months Project
1 Month Go Live Support





ESCOPO: MÓDULOS, PROCESSOS E SISTEMAS



SAMSONITE DO BRASIL E SAMSONITE FRANQUIAS



Duas empresas, 11 cnpj's Lojas e Centro de Distribuicao

PROCESOS FINACEIROS



Plano de Contas, Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade, Ativos, Bancos, Centro de Custos, Ordens CO, Analisis de Retabilidade.

PROCESOS COMERCIAIS RETAIL, E-COMMERCE E WHOLESALE



Dados Mestres de Fornecedores, Clientes, Materiais e Precos.
Ingresso Vendas Retail via Interface (ventas, stock e CxC - POS)
Ingresso Ordens Wholesale, Remessas e NFs.
Ingresso Ordens Ecommerce, Remessas e NF-c

COMPRAS, LOGISTICA, INVENTARIO E REPOSICAO



Ordens de Compras FGDs, Servicos, Consmo e Ativos
Recepção e Armazenamento, Confirmação Serviços, Notas Fiscais e CT-E
Orden de Reposição, Remessas y Notas Fiscais
Transferências de Lojas

SAP ERP, SISTEMAS POS, SISTEMAS ECOMMERCE, WHOLESALE, WMS TRANSPORTE E IMPOSTOS



SAP, LINX UX, LINX OMS, NIMIAN, TECADI, AUDITO, MASTERSAF DW E DFE.

MM
MATERIAL MANAGEMENT



Processo de compras, transferências, inventários, Notas fiscais de fornecedores.

SD
SALES AND DISTRIBUTION



Processo de vendas wholesale, ecommerce e retail, pricing e NF-e. – Ordens – Remessas e Nota Fiscal.

FICO
FINANCE AND CONTROLLING



Contas a pagar, contas a receber, contabilidade, ativos, bancos, centros de custos, ordens e analisis rentabilidade.

PO
PROCESS ORCHESTRATION



SAP e sistemas anexos Linx UX, Linx OMS, Tecadi, Bradesco, Nimian, Mastersaf, Audito.



BW/ BIBO
BUSINESS INTELLIGENCE AND OBJECTS



Relatórios logísticos, comerciais e financeiros.



FASES DO PROJETO

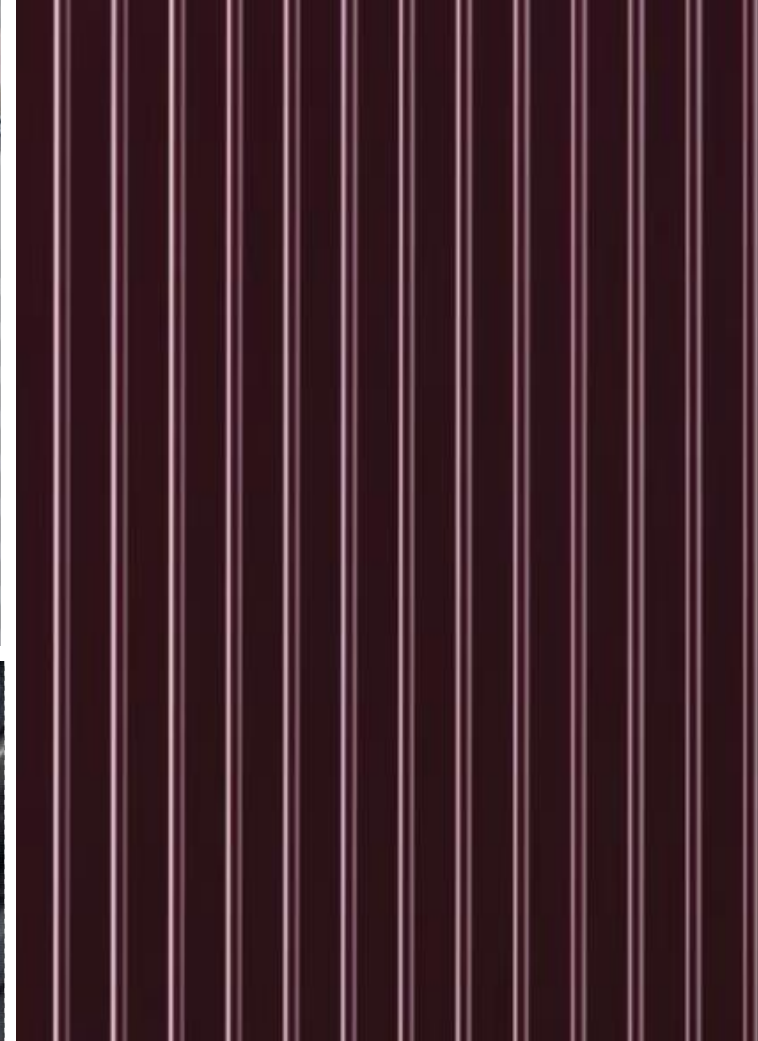



Escotta e Key users
full time

Escotta e Key users
part time

Escotta e Key users
full time

Key users full time
Escotta part time



FASES DO PROJETO

IN



Shopping Morumbi



TUMI Iguatemi FL



OUTLET PREMIUM

BLUE PRINT

Entender e adotar o modelo SAP Latam cubrindo requerimentos legais

- Entender o modelo Brasil e modelo Latam (Dados, Estructura e Processos)
- Verificar os pontos de integracao intermodulos e intersistemas
- Analisar adequacao e levantar GAPS
- Documentar Modelo TOBE
- Aprovar TOBE e Lista de GAPS

REALIZACAO

Construir e Provar os objetos definidos como TOBE.

- Parametrização, Construção de Programas e Integrações
- Documentar configuração e objetos técnicos
- Testar processos individuais e integrações
- Preparar para transporte ordens a sistema de Produção


TESTE INTEGRADO

Capacitar e preparar o negocio para testar E2E, e aprovar UAT

- Capacitacao a Key users e usuarios finais
- Executar teste E2E e regressao fase 1
- Executar teste E2E UAT fase 2

GO LIVE E SUPORTE


- Transporte de Ordens a Sistema de producao
- Validacao de accesos de Roles e Perfis
- Carga de dados mestres
- Carga de dados transacionais
- Carga de Estoque e contas
- Go-Live e Suporte

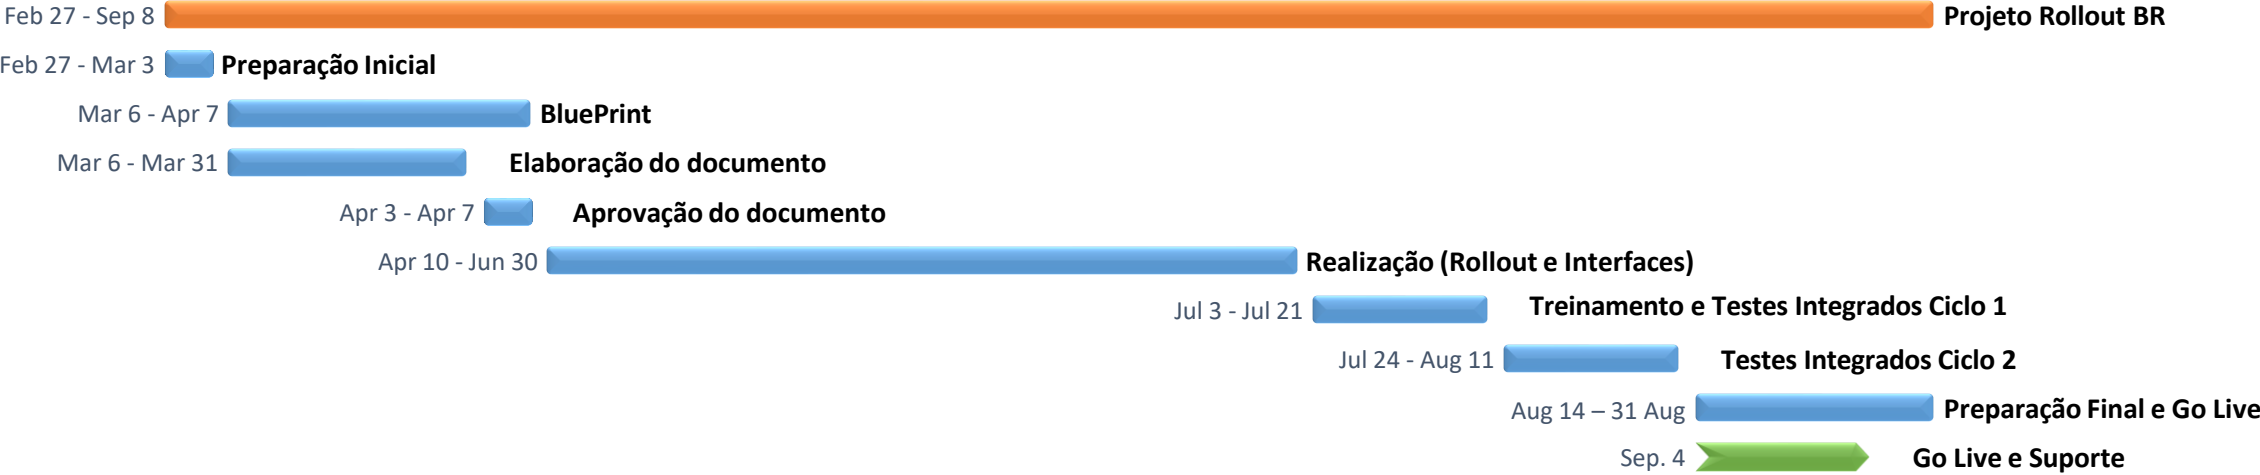



PAPÉIS E RESPONSABILIDADES



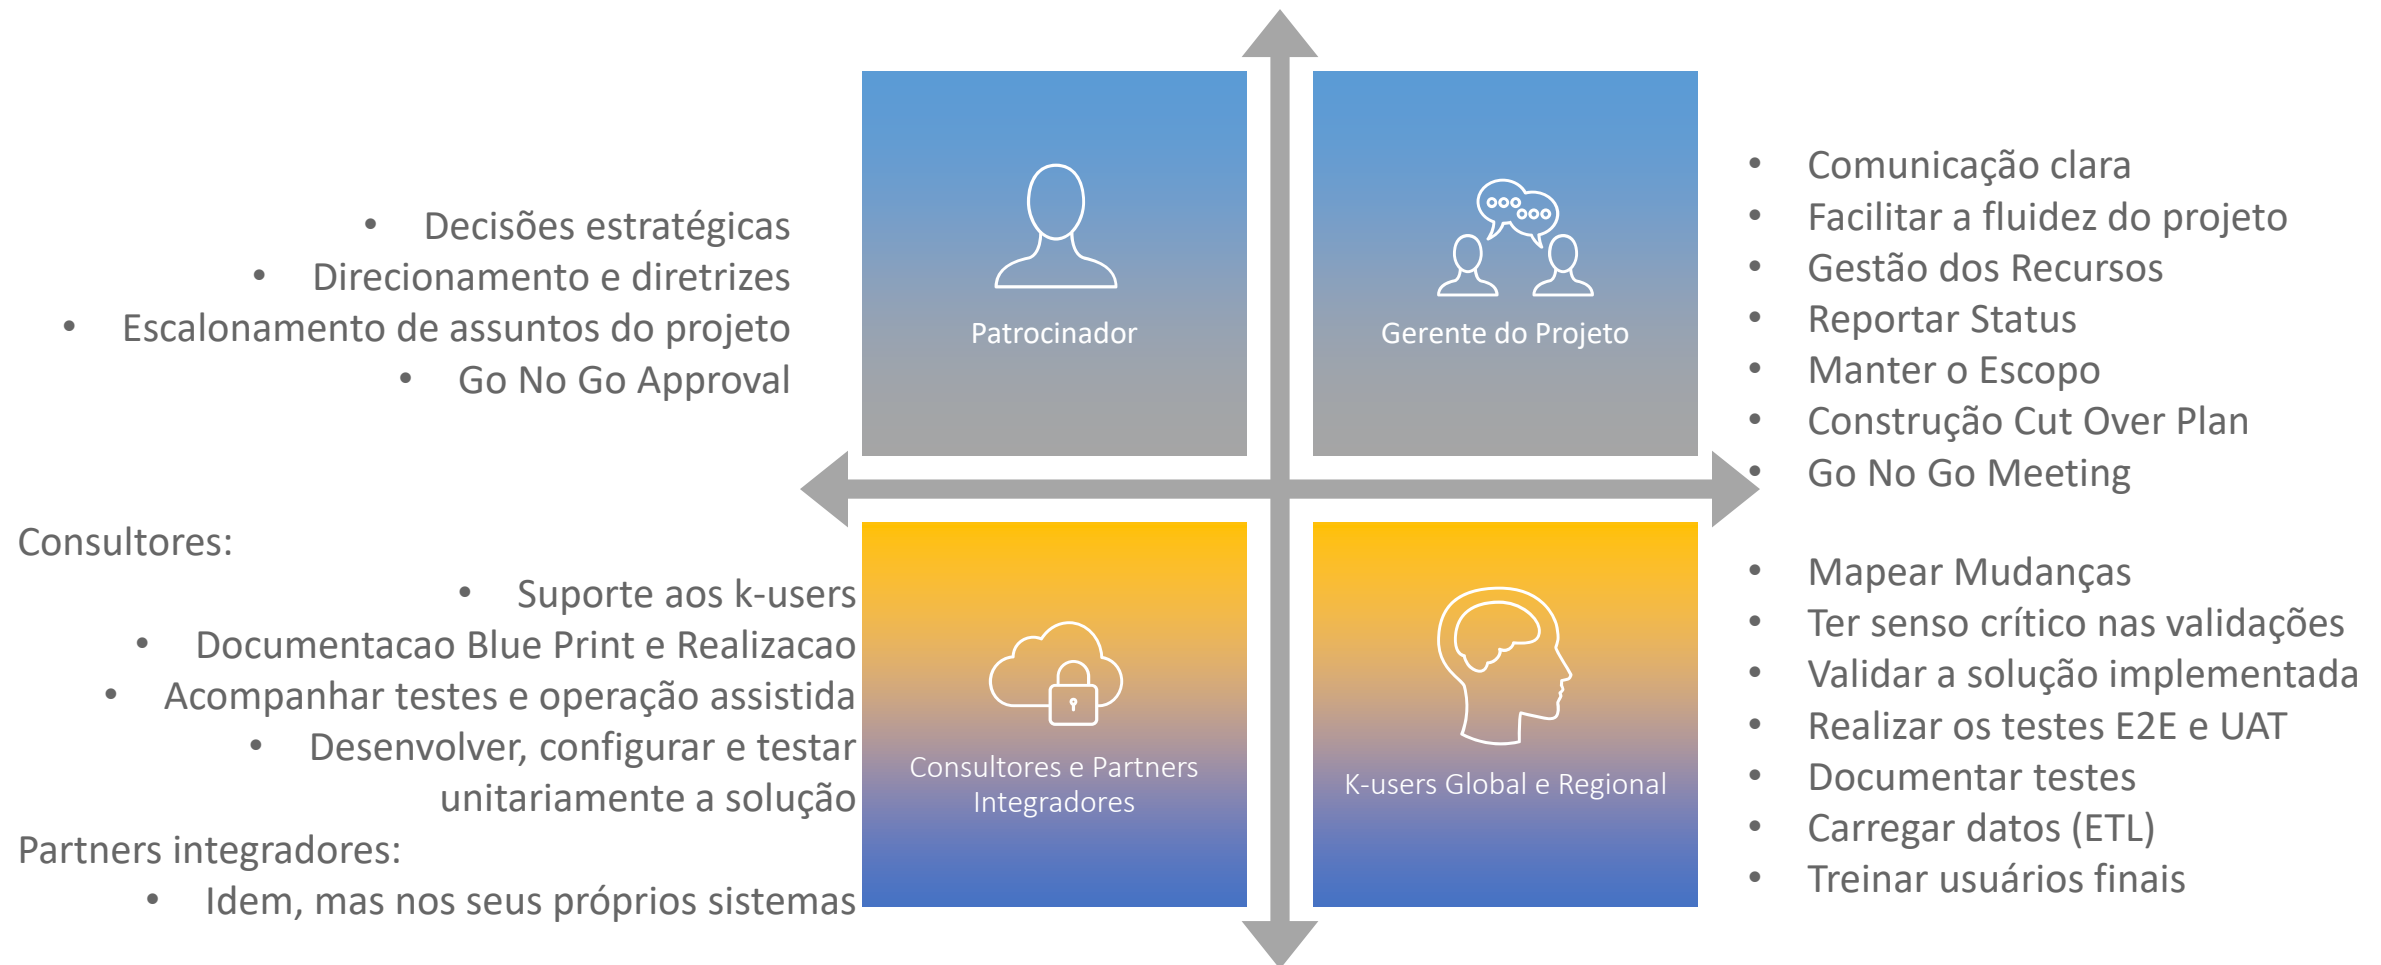



EQUIPES





SAMSONITE BUSINESS KUSER REGIONAL

- Cesar Mancilla
- Andres Coelho
- Elisa Reyes
- Jose Leon
- Sergio Farias

SAMSONITE BUSINESS KUSER E USUARIOS BRASIL

- Ricardo Sales
- Vanessa Gomes
- William Lima
- Camila Daverça
- Douglas Pessoa
- Beatriz Tognete (LINX UX)
- Daviano Tamanho
- Evandro Fonseca
- Jéssica Olinda
- Jonatthan Ferreira
- Luis Paulo (OMS LINX)
- Luiz Poleza
- Rodrigo Bezerra

SAMSONITE SPONSORS

- Roberto Guzman
- Nardelli Gedro
- Hudson Manzano
- Carlos Espinoza
- Francisco Caso

SAMSONITE PROJETO MGT

- Italo Nascimento
- Carlos Canutto
- Maximiliano Lohse
- Nicolas Benavente

Equipe – Escotta

Cristiano Geraldo
Douglas Damini
Isabela Barboza
Jhean Lanski
Lucas Pletsh
Raquel Amaral



Plano de Comunicação





Diário

Alinhamentos **Diários** do projeto.

- Interna Escotta
- Entre Key Users e Escotta
- Teams/Skype/Outlook/Whatsapp

Semanal

Status

Reuniões **Semanais** entre as partes interessadas

- Gerentes de projeto
- Time Escotta
- Time Samsonite




01

BLUEPRINT
(06/03 a 07/04)






2023



2023

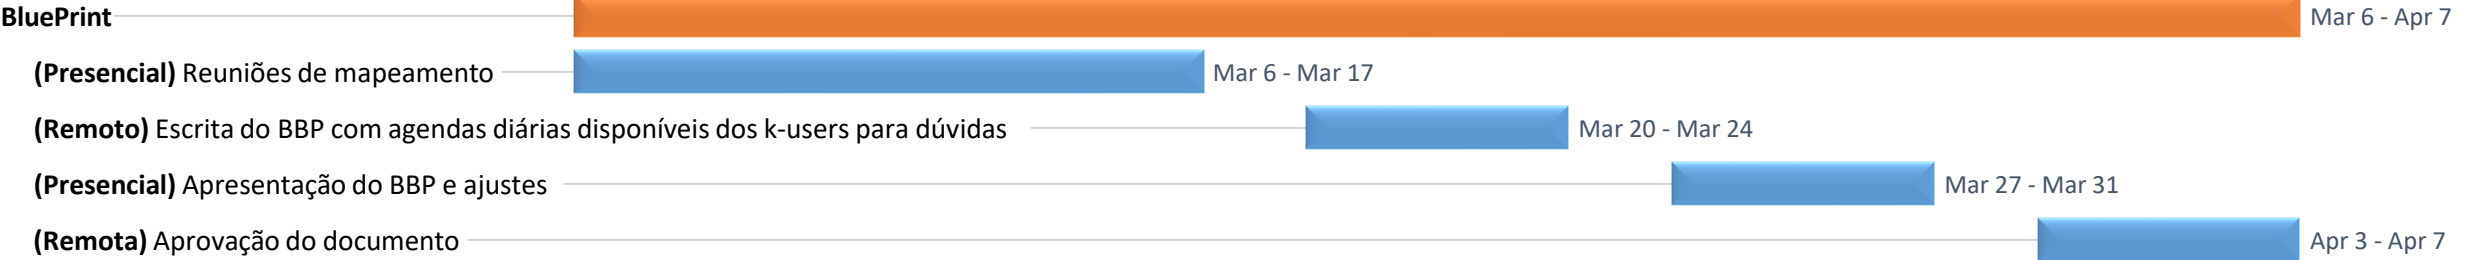



OBRIGADO
